



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NİĞDE GEBERE 2. MERHALE PROJESİ NİĞDE BAHÇELERİ SULAMASI İKMALİ

T.C.
Niğde Valiliği

| | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Su Kaynağı: Gebere ve Yeşilburç Barajları | Su Kaynağı : İşletmede | Su Kaynağı F.G.: % 100 |
| Ana Kanal: - | Ana Boru: 10 000 m | Yerleşim Birimi Faydası: 5 yerleşim |
| Cazibe: 9 300 da | Pompaj: - | Hm: - |


| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Sulama Alanı | 9 300 da |
| İhale Tarihi | 19.01.2017 |
| Sözleşme Tarihi | 24.02.2017 |
| Sözleşme Bedeli | 2 328 889 TL |
| İşe Başlama Tarihi | 06.03.2017 |
| Son İş Bitim Tarihi | 01.12.2017 |
| Yüklenici | İMTA Proje İnş. San. ve Tic. A.Ş. |

2017 YILI

| | |
|-------------------------|--------------|
| Sözleşmesine Göre | |
| 2017 Yılı Ödeneği | 400 000 TL |
| 2017 Yılı Öde. İhtiyacı | 2 300 000 TL |
| 2017 Yılı Harcama | - |
| Parasal Gerç. (%) | - |
| Fiziki Gerç. (%) | - |

AÇIKLAMA:

- Niğde Bahçeleri Sulaması 450 ha ve 1. Merhale Projesi kapsamında yapılan 480 ha lık eski sulama şebekesinin yenilenmesi amaçlanmaktadır.
- Sulama sahasının bir kısmının imara açılmış olmasından dolayı iş 30.11.2016 tarihi itibarıyla tasfiye edildi.
- İkmal inşaatına 06.03.2017 tarihinde başlanmış olup, 2017 yılında tamamlanacaktır.

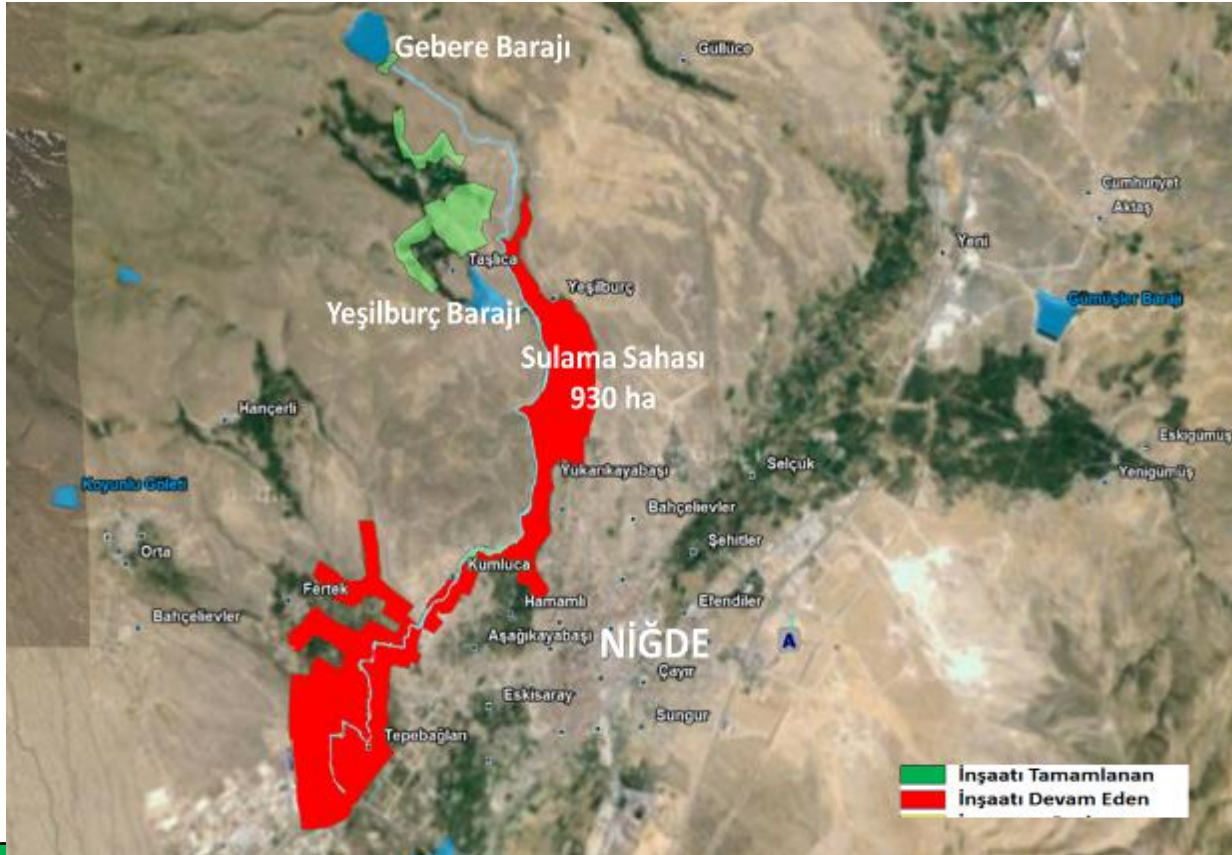

2015 yılı ve öncesi tamamlanan

0 ha

2016 yılı işletmeye açılan

0 ha

2017 yılı hedeflenen

930 ha

2018 ve sonrası tamamlanacak

0 ha



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE BAHÇELERİ SULAMASI VE YENİLENMESİ



Yeşilburç Barajı



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE BAHÇELERİ SULAMASI VE YENİLENMESİ



Gebere Barajı
