




GARİPÇE AYR.-YAHYALI AYR.-NİĞDE OTOYOL BAĞLANTISI ARASI BSK İŞİ

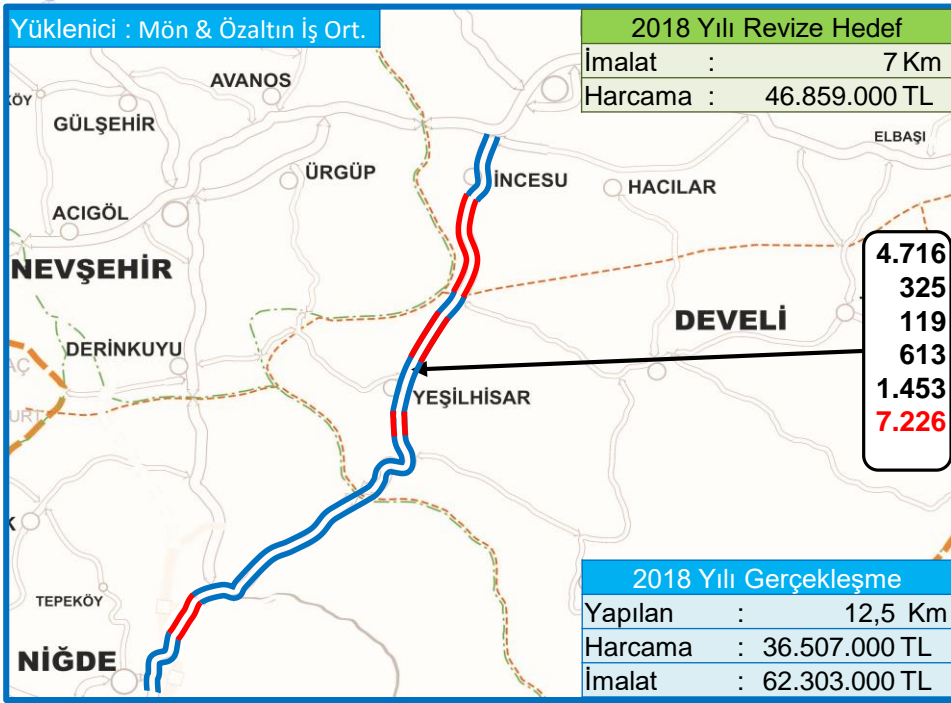

Toplam **109,2 km** uzunluğunda, **BY** standardındaki yolun Niğde ili sınırlarındaki uzunluğu **46,2 km**'dir. Yolun ihalesi **02.12.2016** tarihinde, **247.765.000- TL** ihale bedeli ile yapılmış olup, yol yapım çalışmaları **28.04.2017** tarihinde başlatılmıştır. Planlanan iş bitiş tarihi **17.03.2020**'dir. Yolun toplam **27,3 km** 'lik kesimi **BSK** 'lı olarak tamamlanmıştır.

İşin proje tutarı **(UYF) 389.135.000- TL**'dir. **2017** yılında **(UYF) 15.141.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **51.648.000- TL** olup, nakdi gerçekleşme oranı **%13** ve fiziki gerçekleşme oranı **%20** 'dir. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 337.487.000- TL**'dir.

2018 yılı program ödeneği **20.000.000- TL** olup, **46.859.000- TL** harcanması ve yolun **7 km** 'sinin binder seviyesinde tamamlanması hedeflenmiştir.

2018 yılında **36.507.000- TL** harcanmış olup, **12,5 km** 'lik kesim **BSK** 'lı olarak trafiğe açılmıştır. **2019** yılında çalışmalar devam etmektedir.
