




# NIĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU İKMAL İŞİ

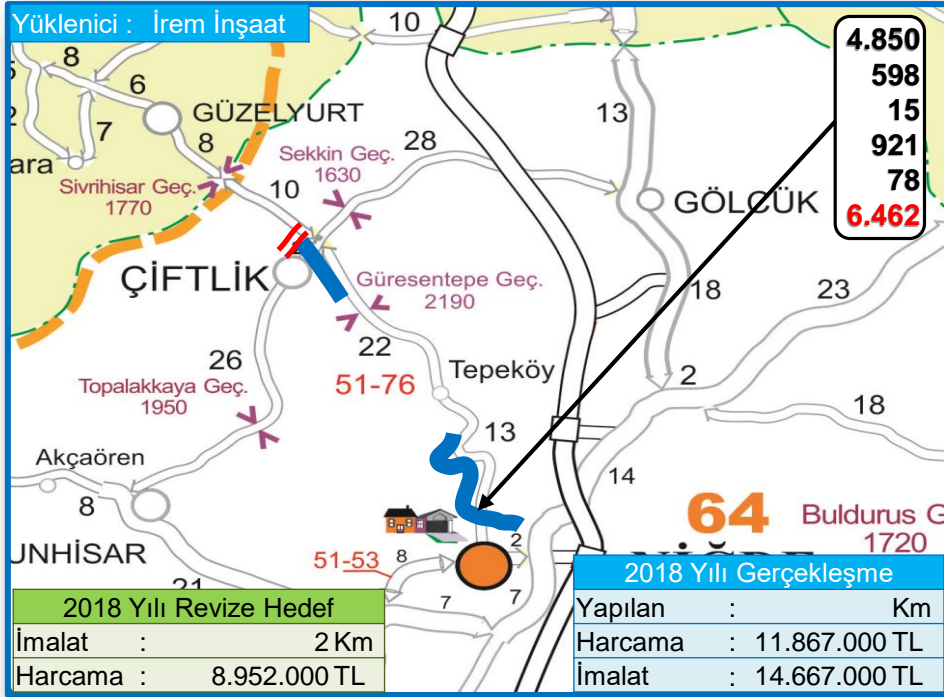

Toplam **18,6 km** uzunluğundaki yolun **17 km'si TY** ve **1,6 km'si BY** standartlarında olup, ihalesi **27.04.2017** tarihinde **31.777.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Yolun yapım çalışmaları **29.06.2017** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **31.12.2019**'dur.

İşin proje tutarı **(UYF) 55.331.000- TL**'dir. **2017** yılında **1.214.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **13.081.000- TL**'dir. Nakdi gerçekleşme oranı **%24** ve fiziki gerçekleşme oranı **%29** 'dur. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 42.250.000- TL**'dir.

**2018** yılı program ödeneği **582.000- TL** olup, **8.952.000- TL** harcanması ve yolun **2 km** 'lik kesiminin **TY-SK** standardında tamamlanması hedeflenmiştir.

**2018** yılında **11.867.000- TL** harcanarak, **1 km** 'lik kesim **TY-SK** 'lı ve Çiftlik Şehir Geçişinde **1,6 km** 'lik kesim **BY** 'de **SK** üzeri **BSK** olarak trafiğe açılmıştır. 2019 yılında çalışmalar devam etmektedir.



# NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU İKMAL İŞİ

