



## YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Niğde İl Özel İdaresi tarafından;

- 6 adedi BSK (SICAK ASFALT KAPLAMA),
- 24 adedi I. ve II. KAT ASFALT KAPLAMA,
- 22 adedi ONARIM,
- 19 adedi STABİLİZE KAPLAMA,
- 2 adedi PROTOKOLLÜ STABİLİZE KAPLAMA,
- 16 adedi MALZEMELİ-ASFALT (YAMA)-GREYDERLİ BAKIM,
- 9 adedi İHALE İŞ VE İŞLEMLERİ,
- 6 adedi KARLA MÜCADELE

olmak üzere toplam 104 adet proje planlanmıştır. Bu projelerin toplam proje tutarı 45.653.240 TL'dir.

Planlanan projelerin 88 adedi tamamlanmış, 12 adedi devam etmekte ve 4 adedi de ihale aşamasındadır.



# İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI



## YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

Yol ve ulaşım hizmetleri projelerinin dönem ödeneği 17.689.307 TL olup, dönem sonuna kadar yapılan harcama 17.689.307 TL'dir.

Yol ve ulaşım hizmetlerinin projelerinin tamamı idaremiz öz kaynakları, Destek Hizmetleri Müdürlüğü akaryakıt, ekipman ve işgücü desteği ve KÖYDES ödeneği kullanılarak gerçekleştirilmektedir..





# İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI



## SU VE KANAL HİZMETLERİ

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde İl Özel İdaresi tarafından;

22 adedi İÇME SUYU,

3 adedi KANALİZASYON,

olmak üzere toplam 25 adet proje planlanmıştır. Bu projelerin toplam proje tutarı 12.315.450 TL'dir.

Planlanan projelerden 5 adedi tamamlanmış, 20 adedi devam etmektedir.

Su ve kanal hizmetlerinin projelerinin dönem ödeneği 12.315.450 TL olup, dönem sonuna kadar 3.271.766 TL harcama yapılmıştır.







# İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI



## *EMLAK VE İSTİMLAK*

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde İl Özel İdaresi tarafından;



1 adedi 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması,

2 adedi 3367 Sayılı Kanun Kapsamında İmar Planı Uygulaması,

olmak üzere toplam 3 adet proje planlanmıştır. Bu projelerin toplam proje tutarı 877.406 TL'dir.

Planlanan projelerin hepsi tamamlanmıştır..

Emlak ve istimlak hizmetleri projelerinin dönem ödeneği 188.300 TL olup, dönem sonuna kadar 164.249 TL harcama yapılmıştır.

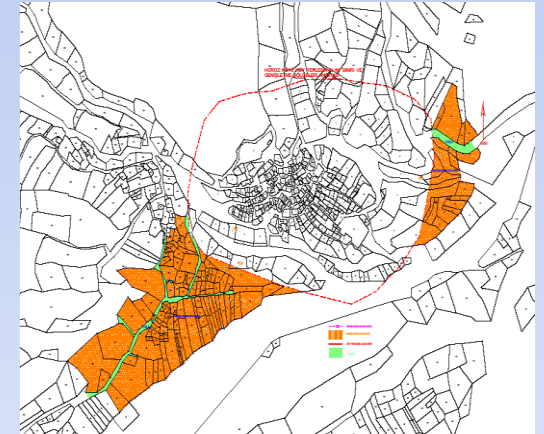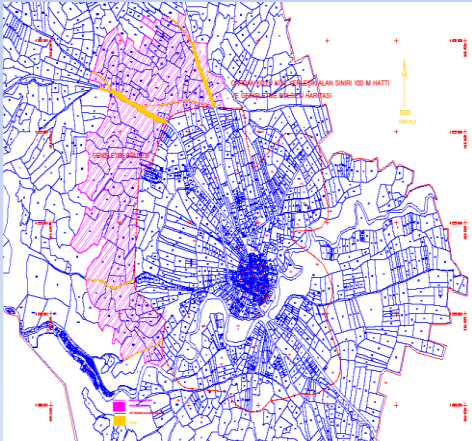



# İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI



## TARIMSAL HİZMETLER

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Niğde İl Özel İdaresi tarafından;

**15 adet TARIMSAL SULAMA TESİSİ** projesi planlanmıştır. Bu projelerin toplam proje tutarı **40.043.812 TL**'dir.

Planlanan projelerden 3 adedi tamamlanmış, 12 adedi devam etmektedir.

Tarımsal hizmetleri projelerinin dönem ödeneği **23.537.259 TL** olup, dönem sonuna kadar **13.040.611 TL** harcama yapılmıştır.

Planlanan projelerin 11 adedi KOP katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.







# İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI



## MALİ HİZMETLER

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Niğde İl Özel İdaresi tarafından;


4 adedi OKUL YAPIMI,

5 adedi AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPIMI,

olmak üzere toplam 9 adet proje planlanmıştır. Toplam proje tutarı 19.050.392 TL olan bu projeler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Planlanan projelerin hepsi devam etmektedir.

Mali hizmetlerin projelere katkısı olan dönem ödeneği 2.800.000 TL olup, dönem sonuna kadar 14.978.040 TL harcama yapılmıştır.

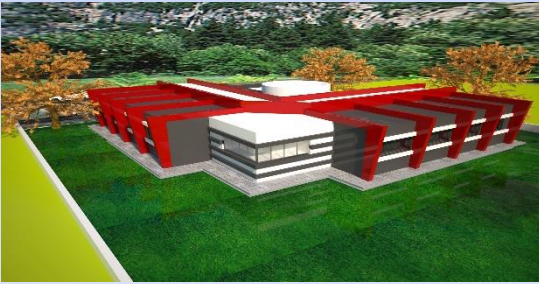



# İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI



## *DESTEK HİZMETLERİ*

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Niğde İl Özel İdaresi tarafından;

7 adedi ARAÇ ALIMI,

1 adedi AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI,

2 adedi LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) ALIMI,

olmak üzere toplam 10 adet proje planlanmıştır. Bu projelerin toplam proje tutarı 19.050.392 TL'dir.

Planlanan projelerin hepsi devam etmektedir.

Destek hizmetleri projelerinin dönem ödeneği 2.800.000 TL olup, dönem sonuna kadar 14.978.040 TL harcama yapılmıştır.

Destek hizmetleri müdürlüğümüz akaryakıt ve ekipman desteğiyle yol ve ulaşım hizmetleri projelerine katkıda bulunmaktadır.







# İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI



## *RUHSAT VE DENETİM*

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Niğde İl Özel İdaresi tarafından;

1 adet 3213 SAYILI MADEN KANUNU KAPSAMINDA İDARİ VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

olmak üzere toplam 1 adet proje planlanmıştır. Bu projelerin toplam proje tutarı 20.509 TL'dir. Proje devam etmektedir.

Ruhsat ve denetim hizmetleri projelerinin dönem ödeneği 25.000 TL'dir, dönem sonuna kadar 3.776 TL harcama yapılmıştır.







## İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI



# PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Niğde İl Özel İdaresi tarafından;

2 adedi REHABİLİTASYON MERKEZİ ve SOSYAL TESİS YAPIMI,

1 adedi MİNYATÜR SENTETİK ÇİM HALI SAHA YAPIMI,

3 adedi BİNA – HAMAM - DÜKKAN – İSKİNAT YAPIMI,

1 adedi KİLİTLİ PARKE TAŞI TEMİNİ ve DÖŞENMESİ,

olmak üzere toplam 7 adet proje planlanmıştır. Bu projelerin toplam proje tutarı 13.608.477 TL'dir.

Planlanan projelerden 2 adedi tamamlanmış, 4 adedi devam etmektedir. Birine de henüz başlanmamıştır.

Plan proje yatırım ve inşaat hizmetleri projelerinin dönem ödeneği 16.644.208 TL olup, dönem sonuna kadar 11.525.346 TL harcama yapılmıştır.

Planlanan projelerin biri KÖYDES katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.





# İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARI

