




ÇAMARDI-POZANTI YOLU

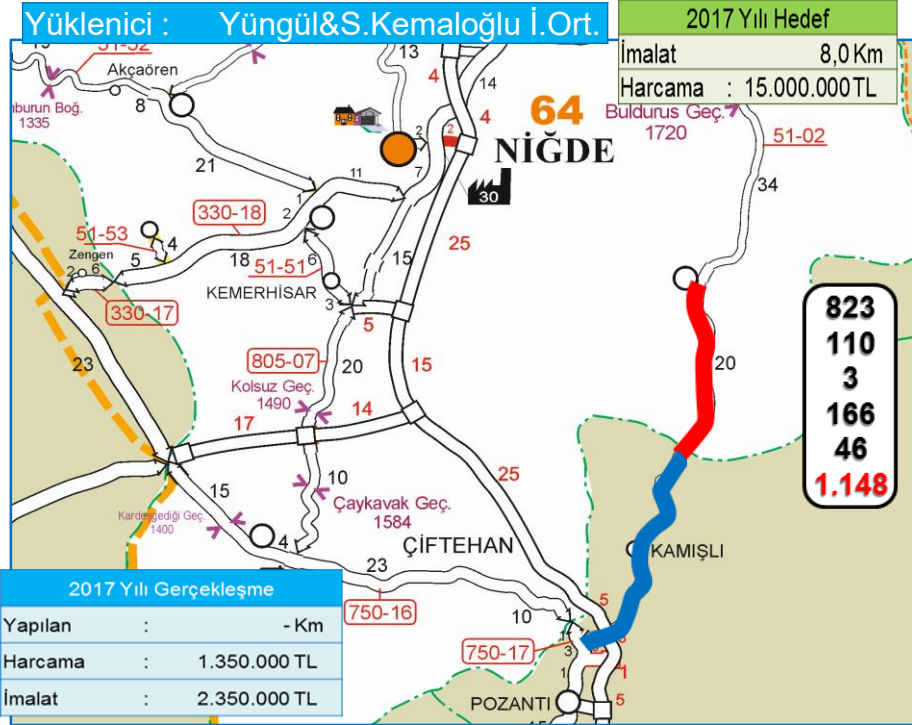

Toplam **50 km** uzunluğunda **TY** standardındaki yolun ihalesi **26.06.2015** tarihinde **40.798.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Niğde il sınırları içerisinde kalan **22 km**'lik kesim önceki yıllarda yapılmış olup, iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Yolun yapım çalışmaları **11.09.2015** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **19.11.2019**'dur.

İşin proje tutarı **(UYF) 56.025.000- TL** 'dir. **2016** yılında **(UYF) 6.796.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **8.146.000- TL** olup, nakdi gerçekleşme oranı **%15** ve fiziki gerçekleşme oranı **%16** 'dır. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 47.879.000- TL** 'dir.

2017 yılı program ödeneği **5.206.000- TL** olup, **8,0 km**'lik kesimin sathi kaplama seviyesinde tamamlanması ve **15.000.000- TL** harcanması hedeflenmiştir. **2017** yılında **1.350.000- TL** harcanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
