




# NEVŞEHİR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI



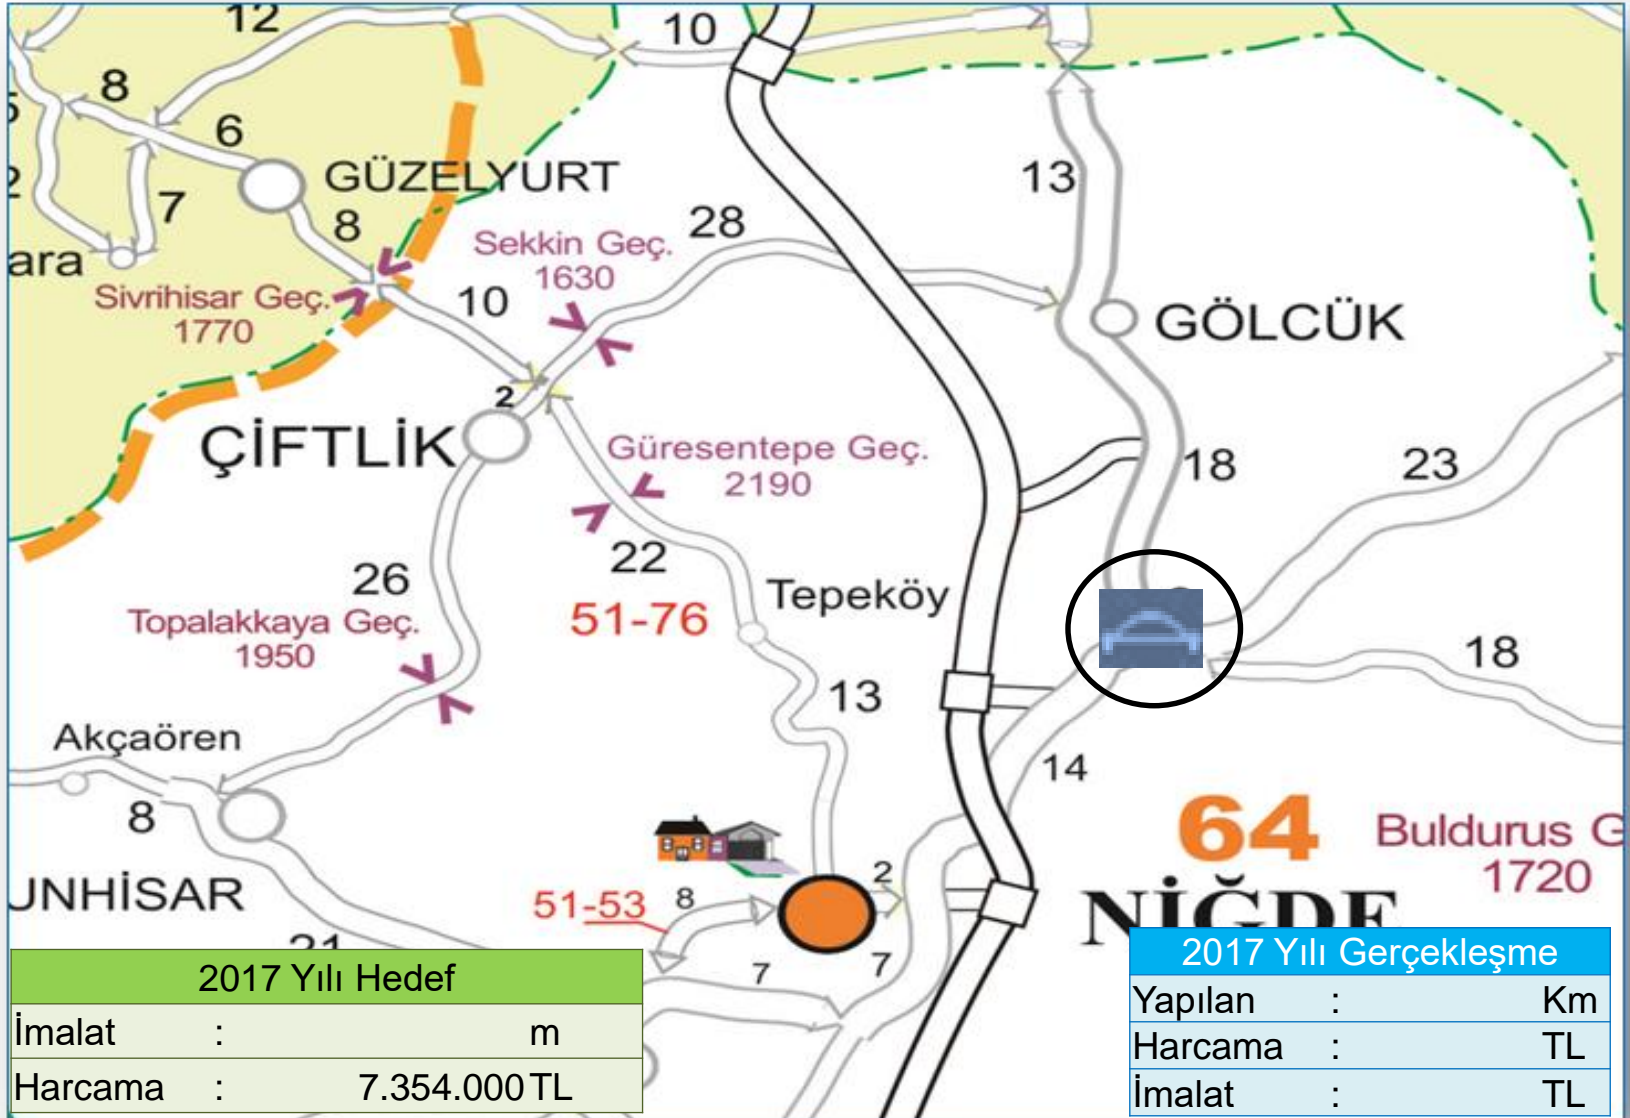

# NEVŞEHİR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI





## NEVŞEHİR KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI



Toplam **148 m** uzunluğunda **4 adet** köprüden oluşan Nevşehir Köprülü Kavşağının ihalesi **27.11.2014** tarihinde **13.287.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Köprünün yapım çalışmaları **02.02.2015** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **31.12.2017**'dir. **2016** yılında **4 Adet / 148 m** uzunluğundaki köprü tamamlanmıştır.

İşin proje tutarı **(UYF) 18.222.000- TL**'dir. **2016** yılı sonu harcaması **(UYF) 2.800.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **10.868.000- TL** olup, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı **%60**'dir. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 7.354.000- TL**'dir.

**2017** yılı program ödeneği **6.000.000- TL** olup, **7.354.000- TL** harcanarak köprülü kavşağın ikincil işleri ile bağlantı yollarının tamamlanması ve trafiğe açılması hedeflenmektedir.
