



ÇAMARDI-POZANTI YOLU




T.C.
Niğde Valiliği

Yüklenici : Yüngül&S.Kemaloğlu İ.Ort.

2017 Yılı Hedef

İmalat : 8,0 Km

Harcama : 15.000.000 TL

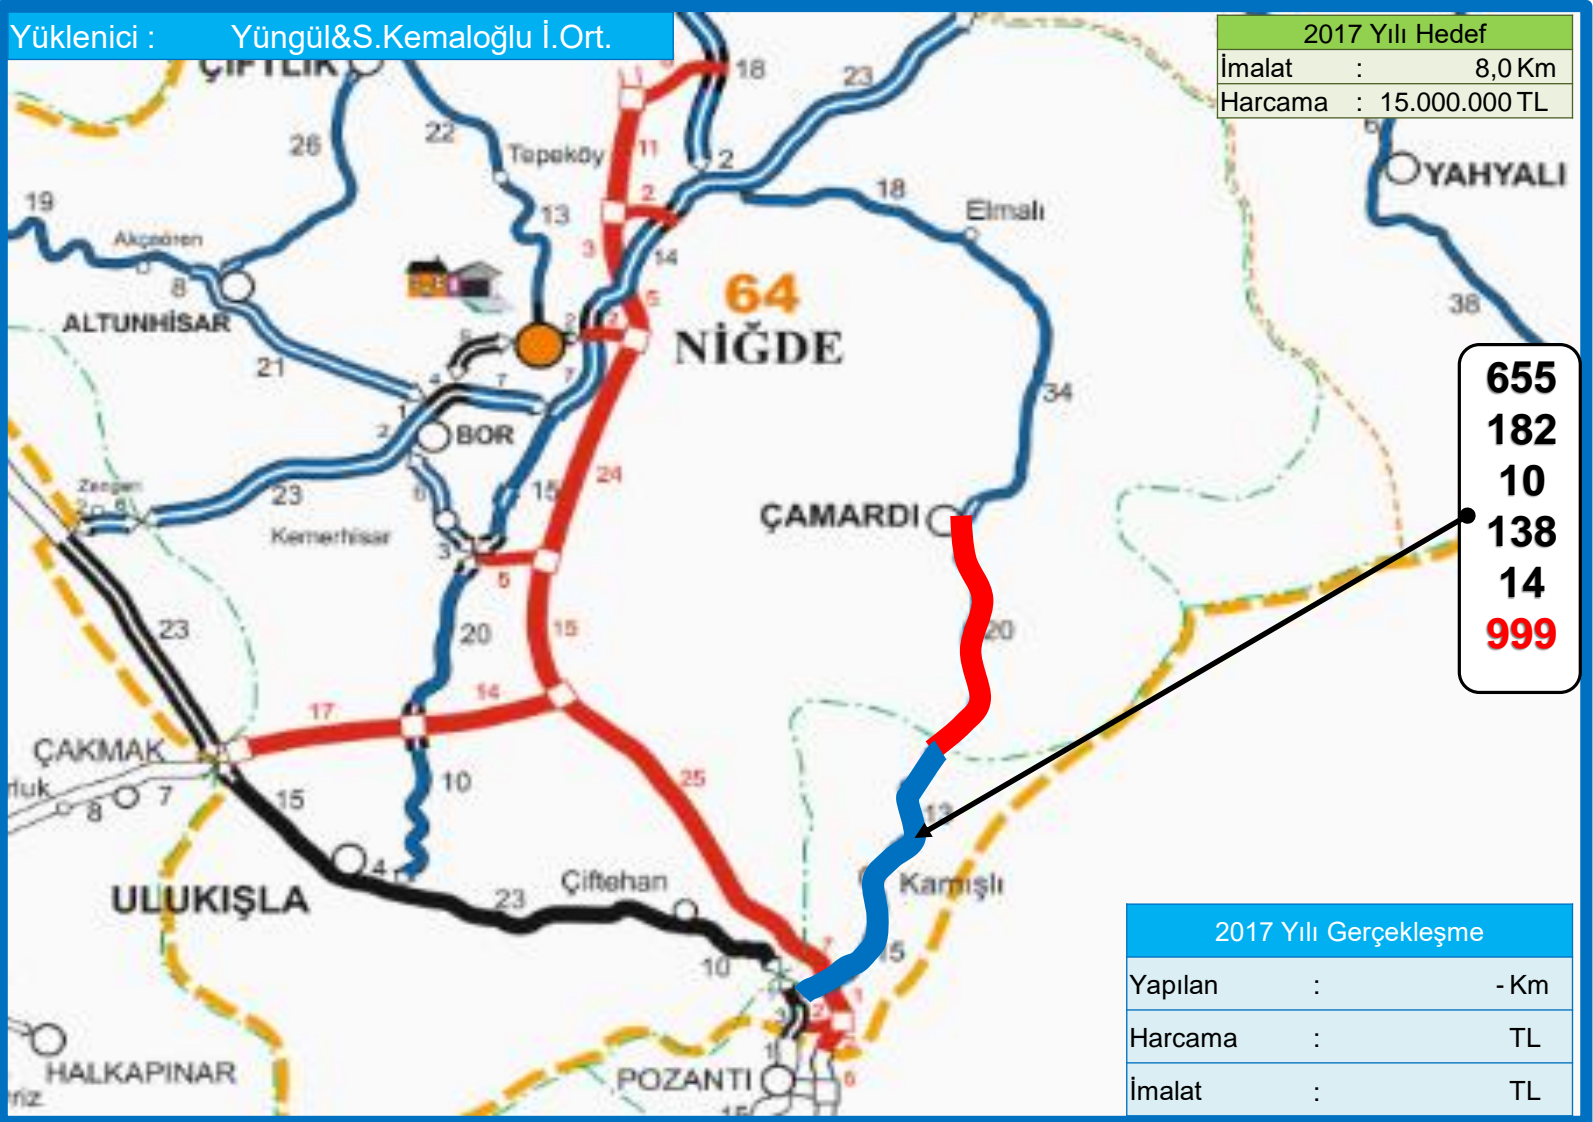



ÇAMARDI-POZANTI YOLU



01/09/2016 11:26



ÇAMARDI-POZANTI YOLU



Toplam **50 km** uzunluğunda **TY** standardındaki yolun ihalesi **26.06.2015** tarihinde **40.798.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Niğde il sınırları içerisinde kalan **22 km**'lik kesim önceki yıllarda yapılmış olup, iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Yolun yapım çalışmaları **11.09.2015** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **19.11.2019**'dur.

İşin proje tutarı **(UYF) 56.025.000- TL** 'dir. Başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **6.796.000- TL** olup, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı **%12** 'dir. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 49.229.000- TL** 'dir.

2017 yılı program ödeneği **5.206.000- TL** olup, **8,0 km**'lik kesimin sathi kaplama seviyesinde tamamlanması ve **15.000.000- TL** harcanması hedeflenmiştir.
