




NEVŞEHİR-NİĞDE YOLU (BY İYİLEŞTİRME)



Yüklenici : Aydın İnşaat

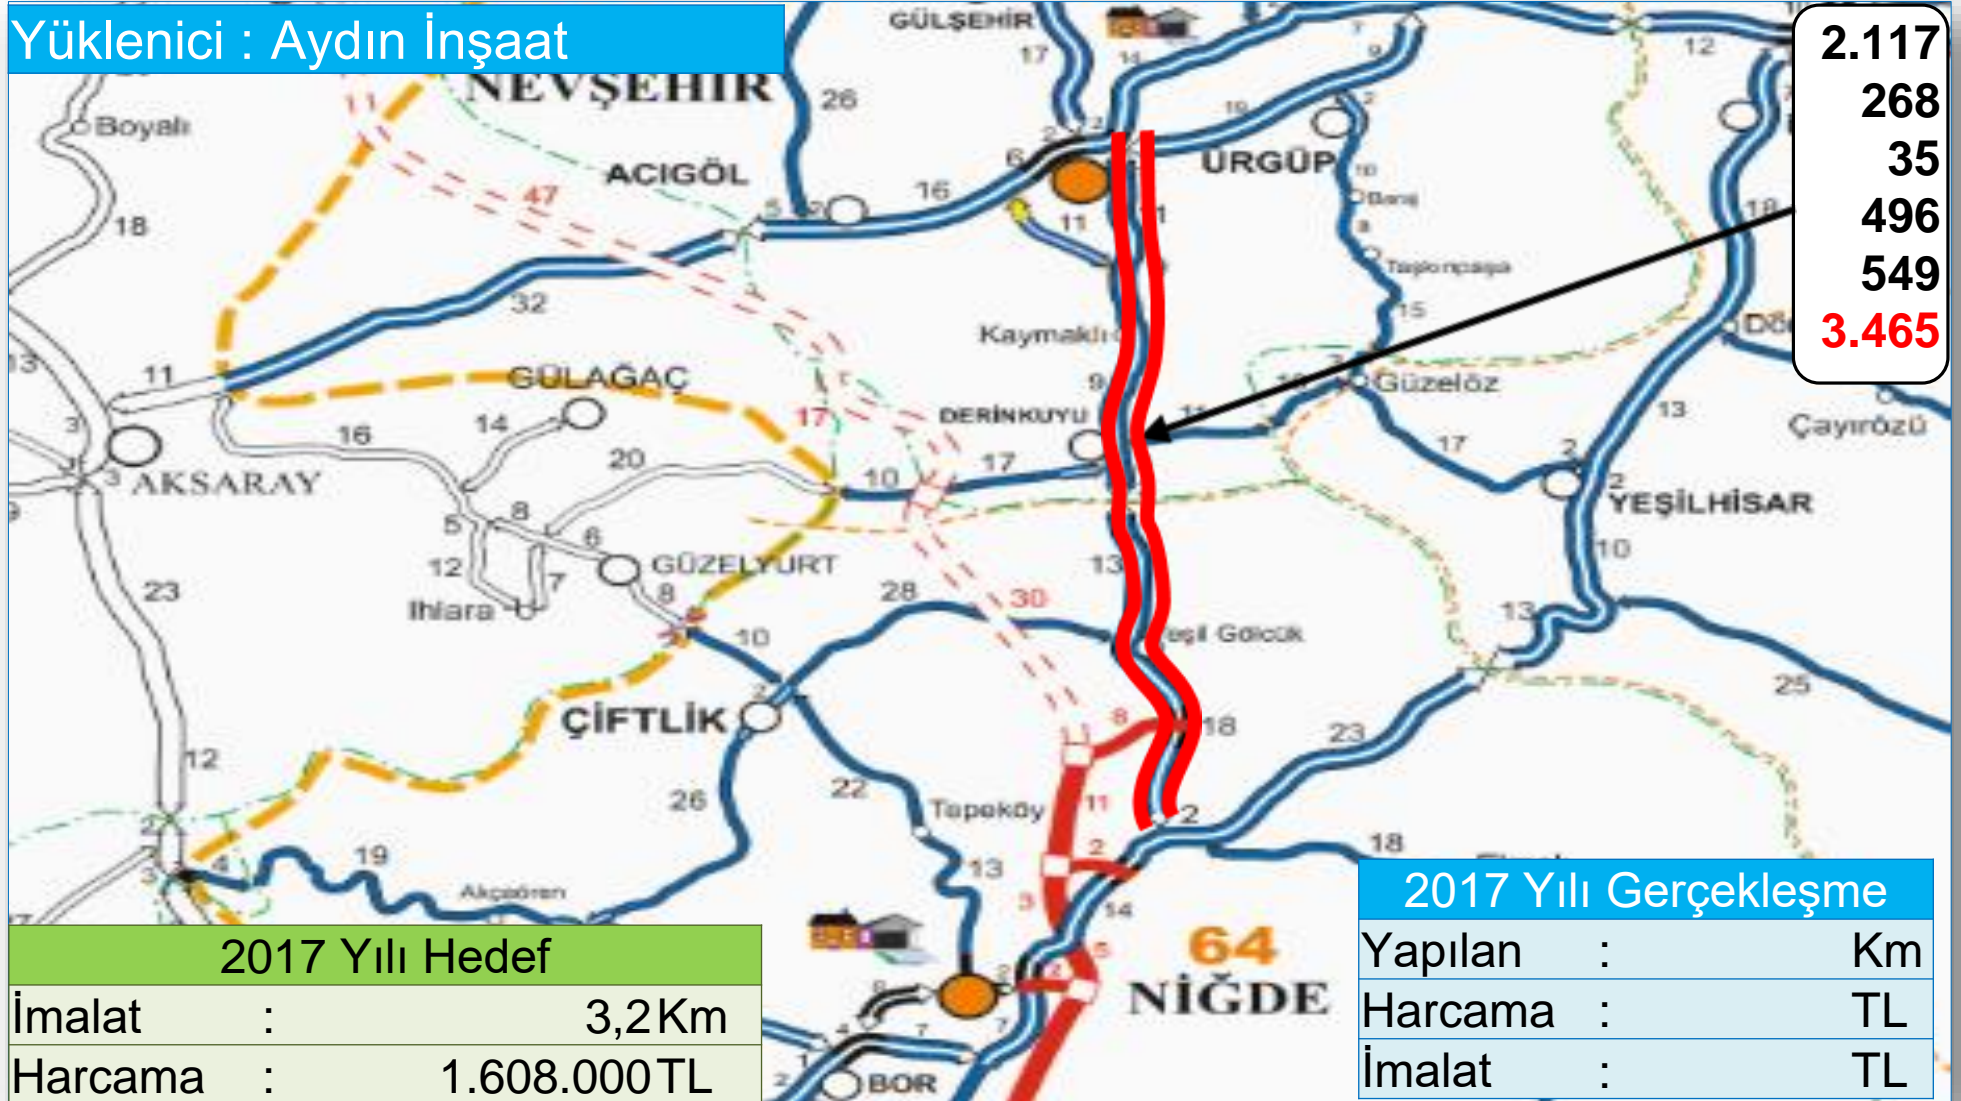



NEVŞEHİR-NİĞDE YOLU (BY İYİLEŞTİRME)





NEVŞEHİR-NİĞDE YOLU (BY İYİLEŞTİRME)



Toplam **11,5 km** uzunluğunda, **BY** standardındaki yolun ihalesi **15.03.2011** tarihinde **8.800.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Yolun yapım çalışmaları **06.07.2011** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **31.12.2017**'dir. **2016** yılı sonuna kadar yolun **8,3 km**'si iyileştirilerek sathi kaplama seviyesinde tamamlanmıştır.

İşin proje tutarı **(UYF) 12.920.000- TL**'dir. **2016** yılı sonuna kadar **3.400.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **11.312.000- TL**'dir. Nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı **%88**'dir. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 1.608.000- TL**'dir.

2017 yılı program ödeneği **685.000- TL** olup, **3,2 km**'lik kesimde yol iyileştirmesinin tamamlanması ve **1.608.000 TL** harcanması hedeflenmektedir.

Çalışmaların **yıl içerisinde** tamamlanması hedeflenmektedir.
