




ÇAMARDI-POZANTI YOLU

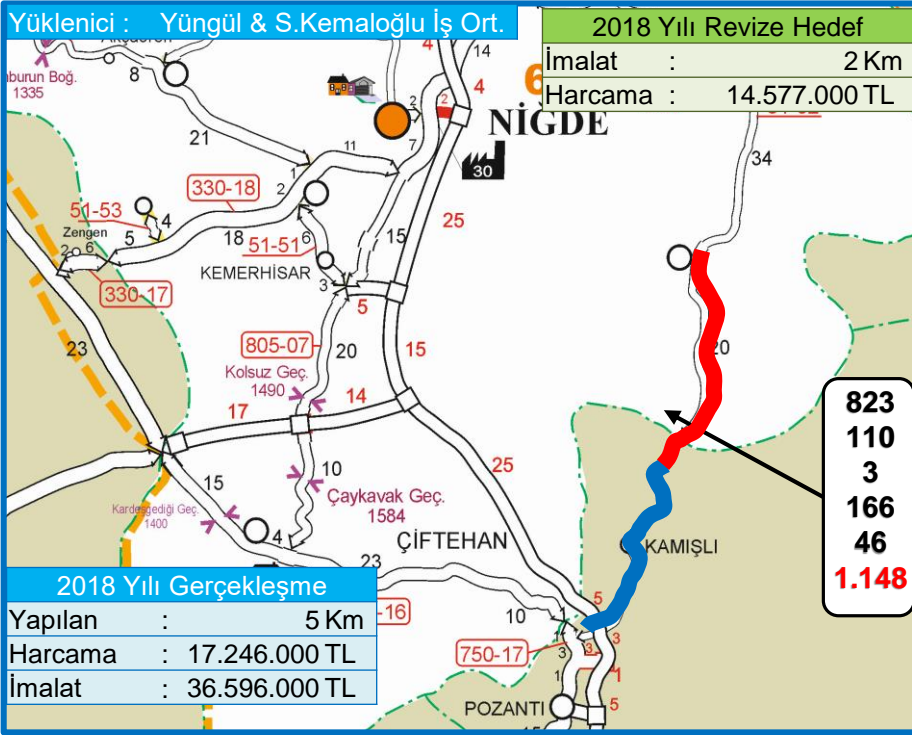

Toplam **50 km** uzunluğunda **TY** standardındaki yolun ihalesi **26.06.2015** tarihinde **40.798.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Niğde il sınırları içerisinde kalan **22 km**'lik kesim önceki yıllarda yapılmış olup, iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Yolun yapım çalışmaları **11.09.2015** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **19.11.2019**'dur. **2017** yılı sonuna kadar yolun **3 km**'si sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak, trafiğe açılmıştır.

İşin proje tutarı **(UYF) 80.656.000- TL**'dir. **2017** yılında **(UYF) 4.658.000- TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **28.701.000- TL** olup, nakdi gerçekleşme oranı **%36** ve fiziki gerçekleşme oranı **%61** 'dir. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 51.955.000- TL**'dir.

2018 yılı program ödeneği **2.000.000- TL** olup, **14.577.000- TL** harcanması ve **2 km**'lik kesimin **TY-SK** olarak tamamlanması hedeflenmiştir.

2018 yılında **17.246.000- TL** harcanmış olup, Adana il sınırlarında **5 km** 'lik kesim **TY-SK** 'lı olarak trafiğe açılmıştır. **2019** yılında çalışmalar devam etmektedir.
