




# NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU



T.C.  
Niğde Valiliği

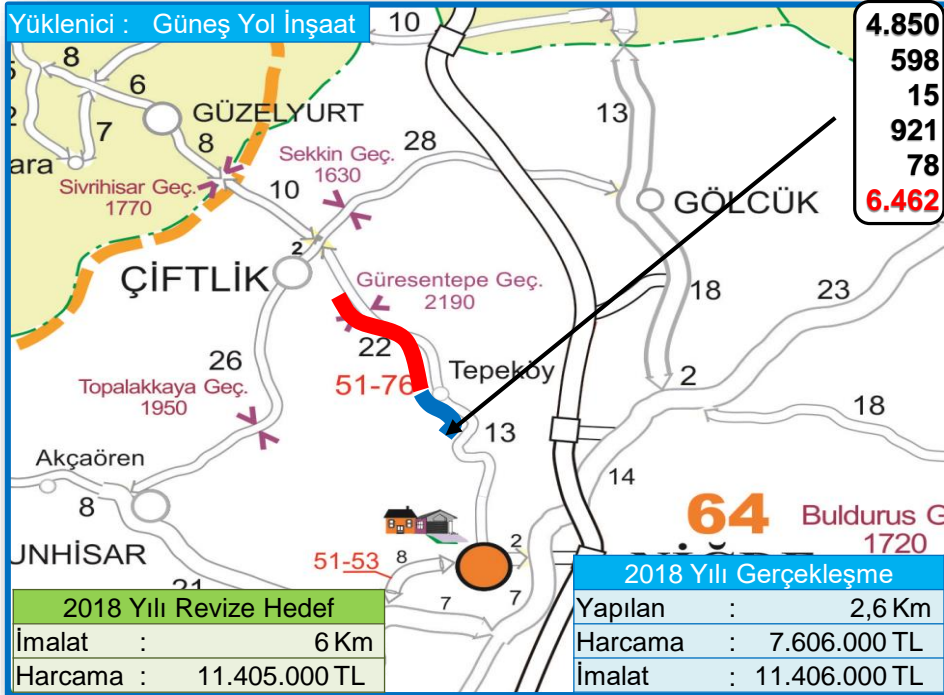

Toplam **33,5 km** uzunluğunda **TY** standardındaki yolun ihalesi **20.08.2013** tarihinde **27.445.000- TL** ihale bedeli ile yapılmıştır. Yolun yapım çalışmaları **18.11.2013** tarihinde başlatılmış olup, planlanan iş bitiş tarihi **31.12.2019** 'dur. **2017** yılı sonuna kadar yolun **10,5 km**'si sathi kaplama seviyesinde tamamlanarak, trafiğe açılmıştır.

İşin proje tutarı **(UYF) 46.902.000- TL**'dir. **2017** yılında **(UYF) 4.082.000 TL** olmak üzere, başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcaması **32.602.000- TL**'dir. Nakdi gerçekleşme oranı **%70** ve fiziki gerçekleşme oranı **%78** 'dir. Kalan işin proje tutarı **(UYF) 14.300.000- TL**'dir.

**2018** yılı program ödeneği **3.000.000- TL** olup, **11.405.000- TL** harcanması ve yolun **6 km** 'lik kesiminin **TY-SK** olarak tamamlanması hedeflenmiştir.

**2018** yılında **7.606.000- TL** harcanarak **2,6 km**'lik kesim **TY-SK**'lı olarak tamamlanmıştır. **2019** yılında çalışmalar devam etmektedir. **18,6 km**'lik kesim için ikmal ihalesi yapılmıştır.



# NİĞDE-TEPEKÖY-ÇİFTLİK YOLU

