



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NİĞDE BAHÇELERİ SULAMASI YENİLENMESİ İKMALI

T.C.
Niğde Valiliği

Su Kaynağı: Gebere ve Yeşilburç Barajları		Su Kaynağı : İşletmede	Su Kaynağı F.G.: % 100
Ana Kanal: -	Ana Boru: 10 000 m	Yerleşim Birimi Faydası: 5 yerleşim	
Cazibe: 930 ha	Pompaj: -	Hm: -	


Sulama Alanı	450 ha yeni + 480 ha yenileme
İhale Tarihi	28.06.2018
Sözleşme Tarihi	27.07.2018
Sözleşme Bedeli	1 763 025 TL
İşe Başlama Tarihi	06.08.2018
Son İş Bitim Tarihi	22.07.2019
Yüklenici	Ulaş ALAKUŞ.

2018 YILI

Sözleşmesine Göre	2.700 000 TL
2018 Yılı Ödeneği	400 000 TL
2018 Yılı Öde. İhtiyacı	-
2018 Yılı Harcama	399.945 TL
Parasal Gerç. (%)	16
Fiziki Gerç. (%)	20 (50)

AÇIKLAMA:

- Niğde Bahçeleri Sulaması 450 ha ve 1.Merhale Projesi kapsamında yapılan 480 ha'lık eski sulama şebekesinin yenilenmesi amaçlanmaktadır.
- İkmal işinde Havuz İnşaatı, basınç kırıcı yapılarında imalatlar tamamlanmıştır.

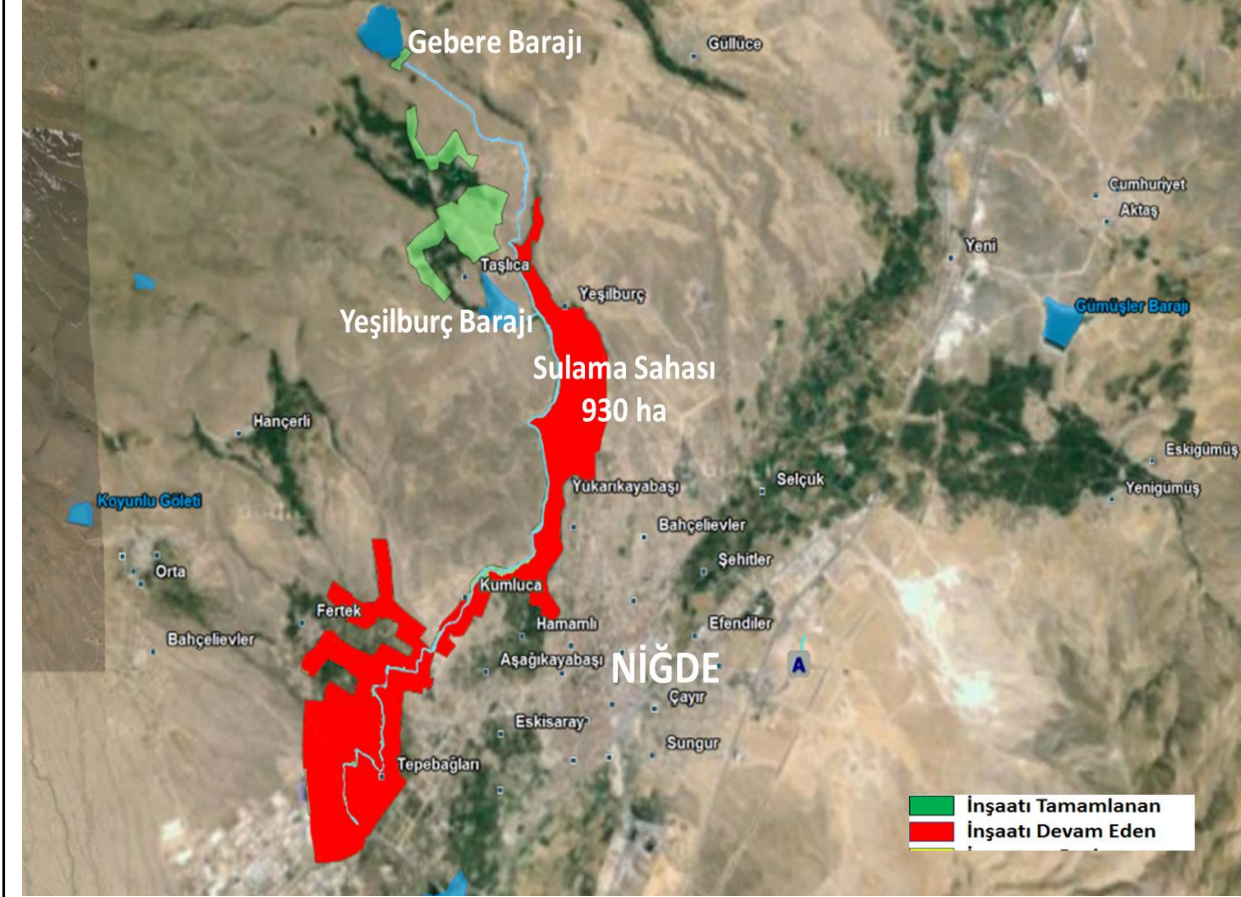

2016 yılı ve öncesi tamamlanan	2017 yılı işletmeye açılan	2018 yılı hedeflenen	2019 ve sonrası tamamlanacak
0 ha	0 ha	0 ha	450 ha



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE GEBERE 2. MERHALE PROJESİ NIĞDE BAHÇELERİ SULAMASI İKMALİ

Sulamadan Faydalanan Yerleşim Birimleri

1. Hamamlı,
2. Kumluca
3. Aydın yurt
4. Yeşilburç
5. Taşlıca



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE BAHÇELERİ SULAMASI VE YENİLENMESİ



Yeşilburç Barajı



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE BAHÇELERİ SULAMASI VE YENİLENMESİ



Gebere Barajı



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NIĞDE BAHÇELERİ SULAMASI VE YENİLENMESİ



Yeşilburç Barajı



DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



NİĞDE BAHÇELERİ SULAMASI VE YENİLENMESİ

T.C.
Niğde Valiliği



Su Alma Havuzu
